


2

# Etape 2 - Lancer officiellement la démarche

## Elaborer une feuille de route Numérique Responsable

Ce support a été produit par l'ANCT lors de l'expérimentation lancée en novembre 2022 pour accompagner 6 collectivités-territoriales pilotes dans l'élaboration de leur stratégie numérique responsable. Il est mis à disposition de tous les acteurs en libre-accès ([licence ouverte Etalab 2.0](#)) pour servir de modèle. Il peut donc être repris, modifié, complété. La police Marianne et la Marianne sont par contre réservés aux administrations publiques.

# Rappel du pas à pas méthodologique

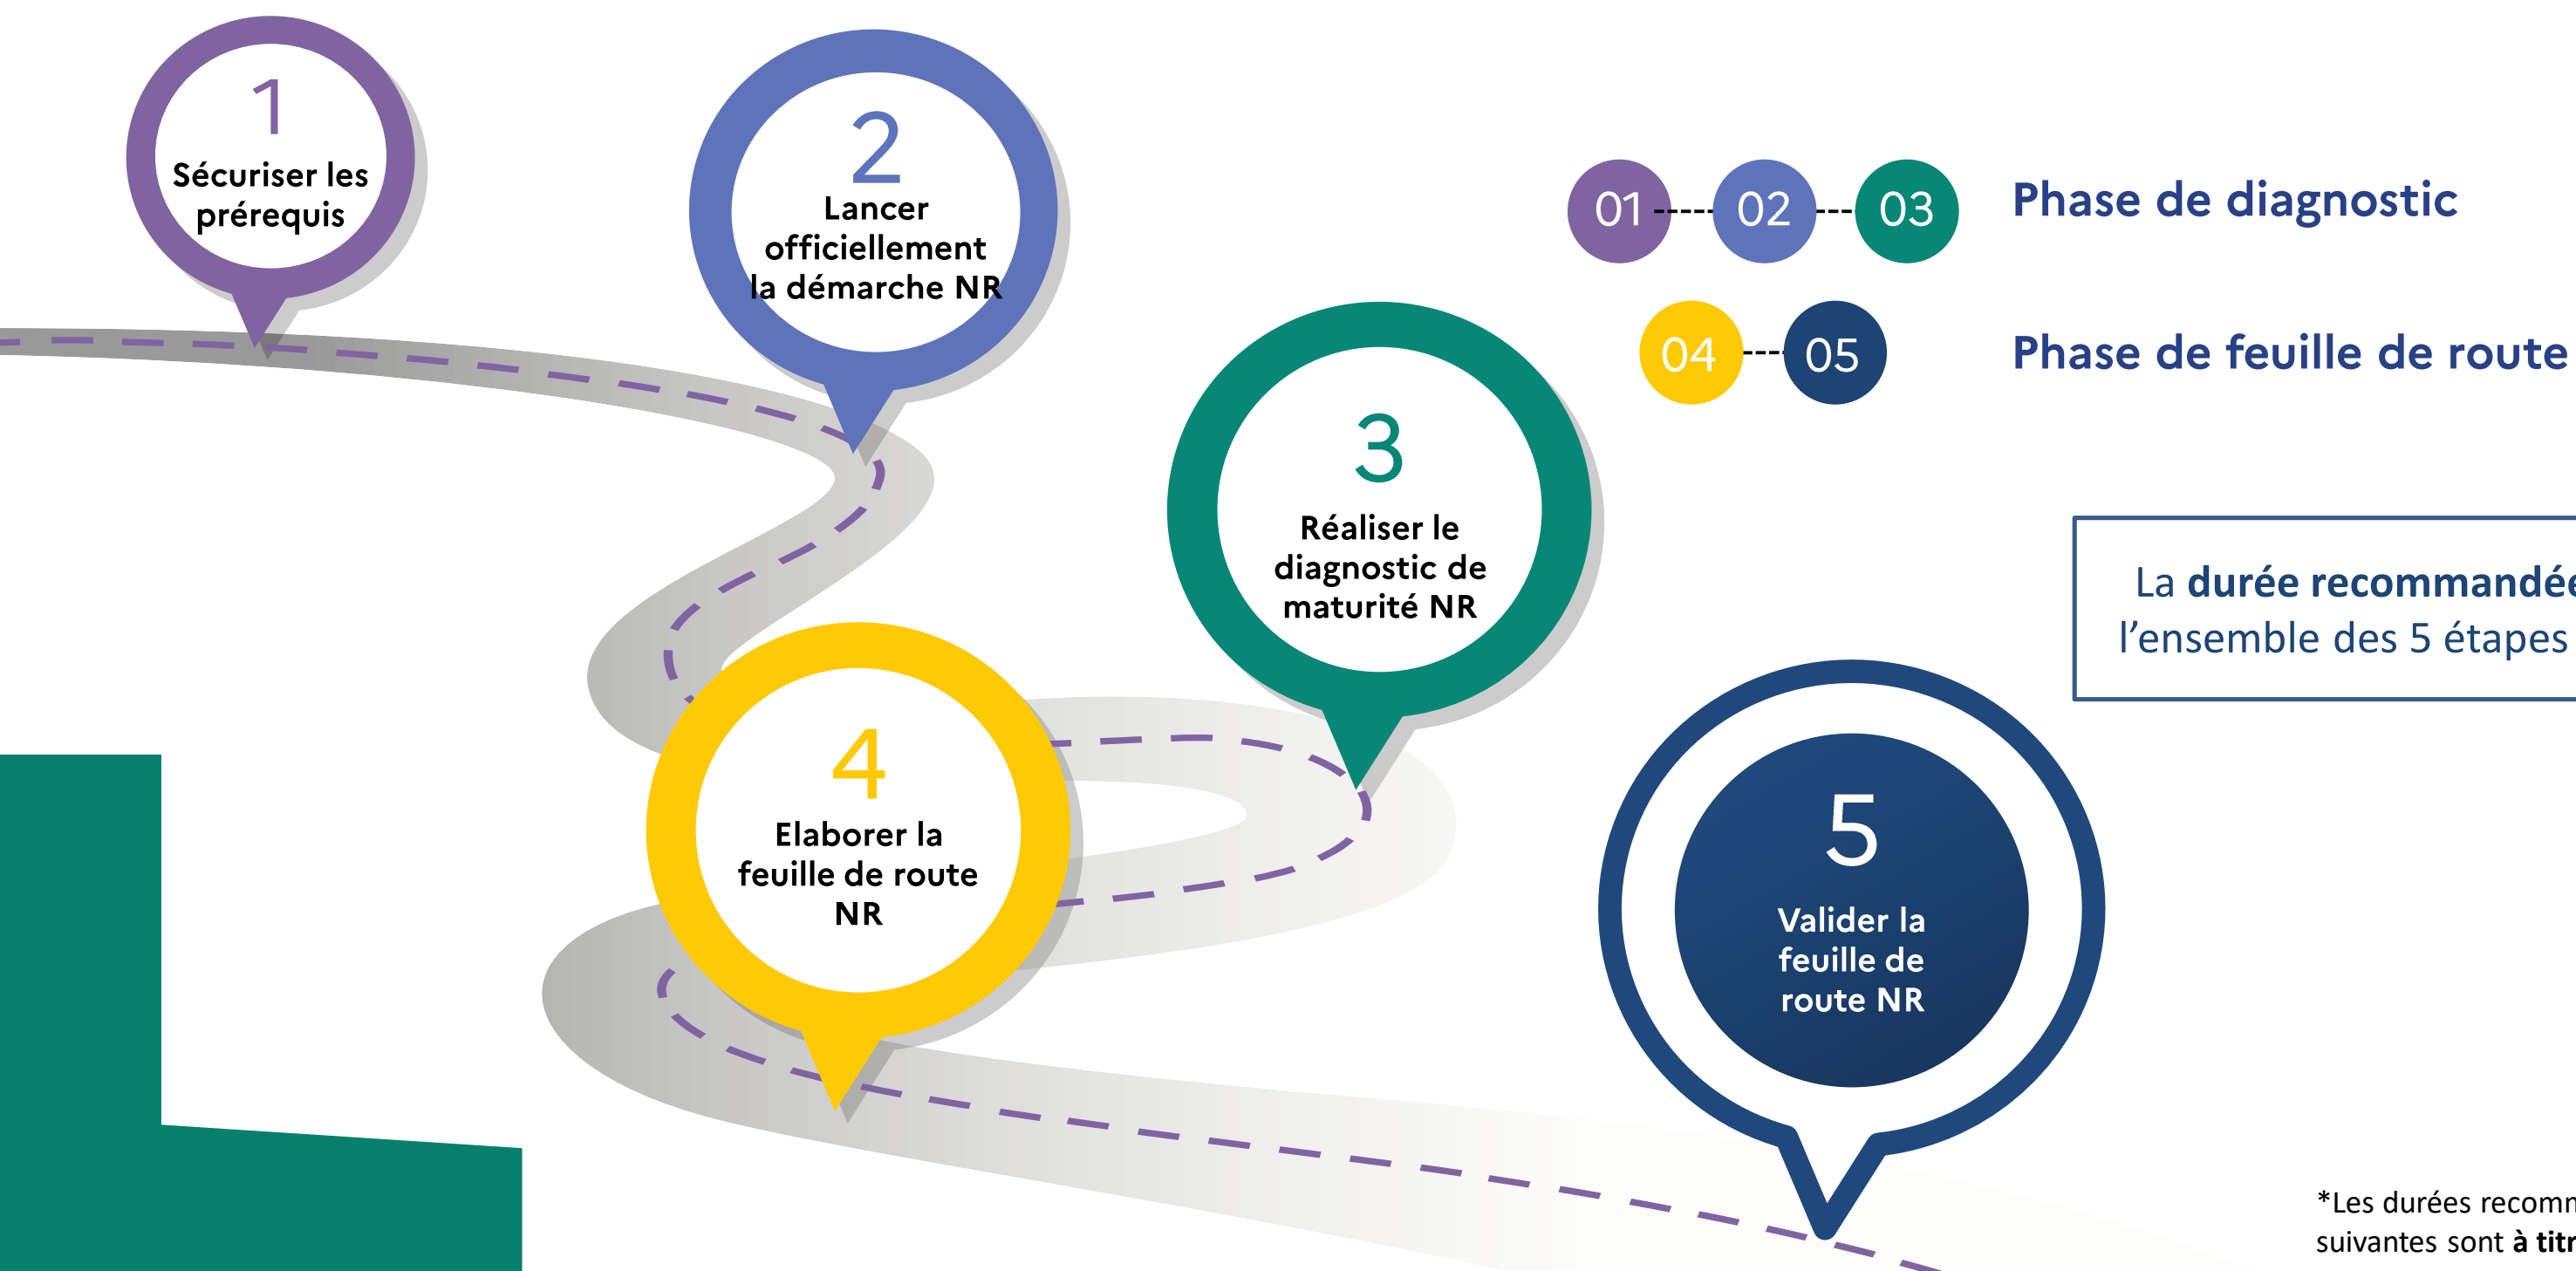

\*Les durées recommandées ici et dans les pages suivantes sont à **titre indicatif uniquement**

## 2. Lancer officiellement la démarche

Durée recommandée : 2-3 semaines


### Activités à mener

- Identifier les **personnes qui participent au comité de lancement** et fixer la date de la réunion
- Lancer les **invitations** et s'assurer de recevoir les **confirmations**
- Préparer la **logistique** pour le comité de lancement (réservation de salle, vérification de la disposition d'un projecteur ou d'un écran, invitation visio-conférence si participants à distance, etc.)
- Préparer le **support du comité de lancement** qui présente le contexte, le planning, la démarche et les prochaines étapes du projet
- **Prépositionner les acteurs** (par exemple les élus ou les DG/DGA) qui porteront les **mots d'introduction**
- **Animer** la réunion
- Élaborer le **compte rendu** et le **diffuser** ensemble avec le support de présentation

### Nos recommandations

- Prévoir **1h à 1h30** pour la durée en fonction du nombre de participants et du niveau de leurs interventions
- **Donner la parole au(x) sponsor(s)** du projet pendant la réunion
- Profiter de l'instance pour **souligner les points forts** et **valoriser les travaux engagés** et les **premières réussites**
- Pré-identifier les **interlocuteurs pertinents à interroger pour la phase de diagnostic** en séance
- Définir si possible une **date de restitution du diagnostic** en séance avec l'ensemble des participants
- Eviter ou traduire les **acronymes métiers** dans le support de présentation et lors de la présentation
- S'assurer que les **participants au comité de lancement** seront en **capacité de valider la feuille de route** et sa mise en œuvre (ambition, budget, ressources...). Ils devront être **présents à la restitution finale de la feuille de route**.

### Outils à disposition

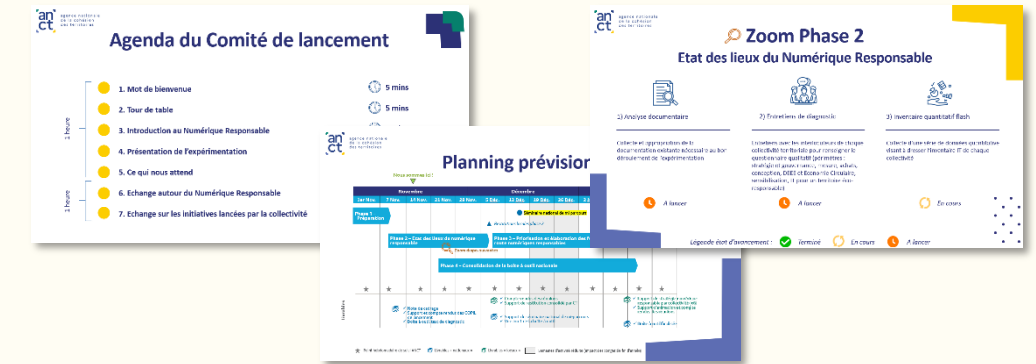

**Support de réunion de lancement**  
(sous format Powerpoint)


*Pour accéder au support complet*

**Cliquez ici**

### Le mot des pilotes

« **Préalable indispensable au bon déroulement du projet, le comité de lancement permet de réunir l'ensemble des parties prenantes. Objectifs d'une stratégie numérique responsable, attendus de la collectivité, étapes du projet, ... autant de points sur lesquels il convient de s'accorder collectivement avant de rentrer dans le vif du sujet !** »

**C. Moutardier – Directrice de projet Transition Ecologique – Evry-Courcouronnes**





# Fin de l'étape 2

Etape suivante :

« Réaliser le diagnostic de maturité Numérique responsable »

